

شماره :	بسمه تعالی	 شرکت ارتباطات سیار ایران
تاریخ :	فرم A4	
پیوست :	کد مدرک (FO-343-43)	

((دستورالعمل نصب پکیج و تامین راهرو سرد بسته))

- ۱- یک عدد پکیج ۲۰ تن پایین زن موجود در انبار کردان (تهران) تحویل و در سالن دیتا سنتر طلاب مشهد طبق نقشه جانمایی پیوست نصب گردد.
- ۲- در زیر کف کاذب ها به منظور جلوگیری از پخش شدن هوای سرد خروجی پکیج در سالن ، حداقل کف کاذب تا کف واقعی با ورق فلزی مناسب پوشانده شده و تمامی درزها به خوبی گرفته شود. در نقشه پیوست محدوده ای که باید ورق ها نصب شوند نمایش داده شده است.
- ۳- یک راهرو سرد باید با مشخصات زیر ایجاد گردد:
 - ۱-۳- در دو سمت راهرو دو عدد درب دو لنگه با قابلیت باز و بست غیر اتوماتیک (دستی) تامین و نصب گردد.
 - ۲-۳- سقف راهرو جهت جلوگیری از خروج هوای سرد تعبیه و نصب گردد.
 - ۳-۳- یک سمت راهرو با رک و سمت دیگر راهرو با دیوار بسته خواهد شد. تجهیزات، کالاها و اجناس مناسب جهت بستن راهرو با دیوار تامین و مورد استفاده قرار گیرند.
- ۴- کانال کشی در زیر کف کاذب از خروجی پکیج تا راهرو سرد صورت پذیرد.
- ۵- بیست و شش عدد از کف کاذب های موجود در راهرو سرد باز شده و به جای آنها کف های شیار دار استفاده شود. برند کف ها هم جنس برند به کار رفته باشد و پایه ها تعویض نگردد.
- ۶- کابل کشی با کابل 3*35+16 از تابلو های EMP مرکز تا ورودی پکیج صورت پذیرد. تامین کابل و کابل کشی بر عهده پیمانکار می باشد. در حدود ۳۵ متر کابل جهت این بند در نظر گرفته شود. شماره فیوز مربوطه در حین انجام کار به پیمانکار اعلام خواهد شد.

①


 ۱۷/۵/۲۰
 امیرالمنصور


شماره :	بسمه تعالی	
تاریخ :	فرم A4	شرکت ارتباطات سیار ایران
پیوست :	کد مدرک (FO-343-43)	

۷- کابل کشی با یک رشته کابل گراند 1*25 از شین گراند موجود در راهرو سرد تا پکیج صورت پذیرد. در حدود


۱۰ متر کابل گراند 1*25 جهت اجرای این بند مورد نیاز می باشد که بایستی توسط پیمانکار تامین و کابل

کشی گردد.

②



۹۷/۵/۲۰
 ابراهیم

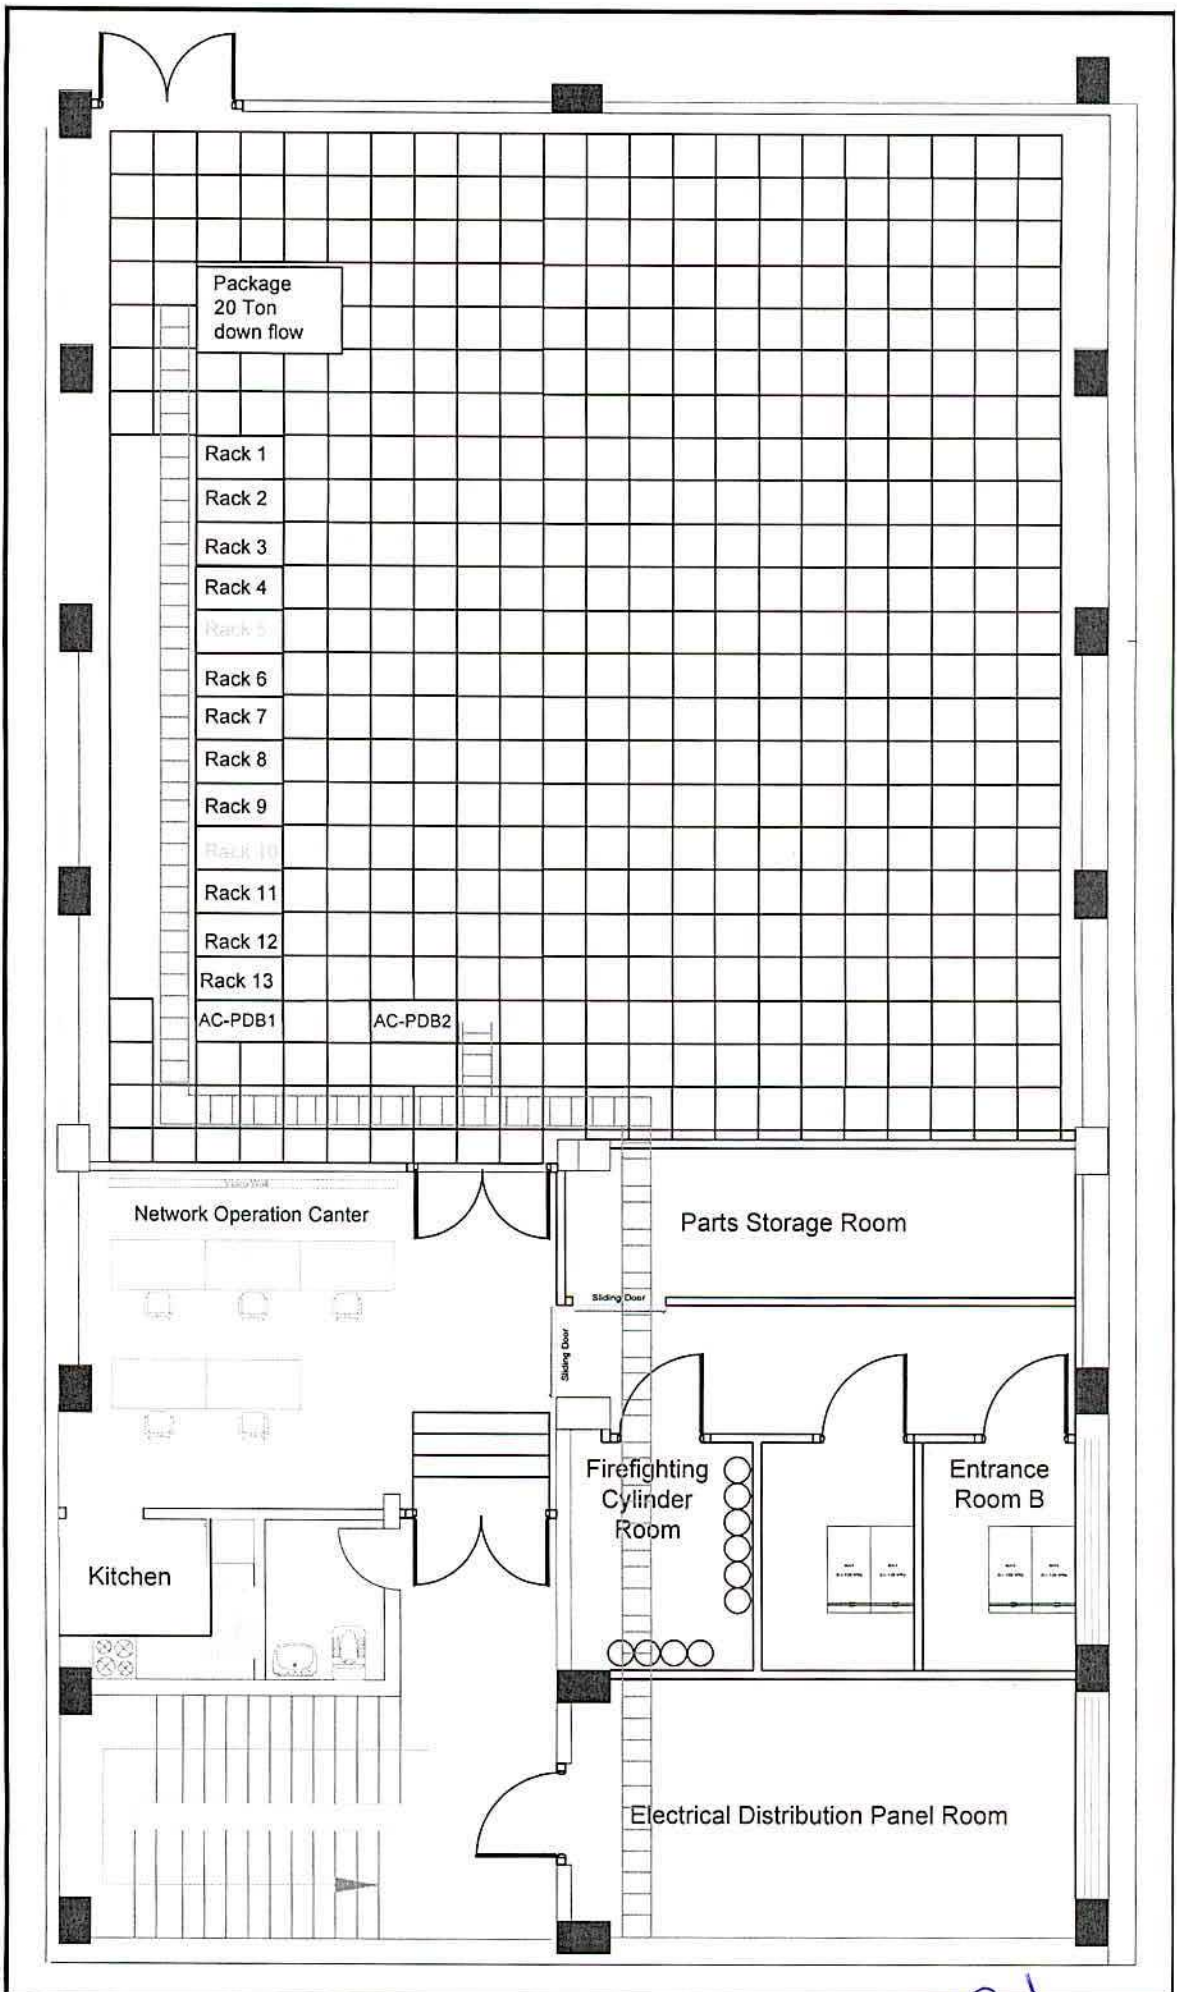

3
